



ASML nieuwbouw 5L Logistiekgebouw & 6KLM kantoren

3

November 2019


November 2019



De grootste stort tot nu toe, vloervelden W2, W3 en W4 waarbij 2050m³ oftewel 205 betonmixers verwerkt zijn. Zelfs zijn er 3 betonpompen ingezet om deze enorme klus te klaren.

Op W6, W7 en een klein fragment van W4 werd op een ander tijdstip met 2 betonpompen totaal 1080m³ beton gestort.

De nieuwe parkeergarage is reeds enige maanden in gebruik genomen en biedt plaats voor 3000 parkeerplaatsen. Voor de parkeergarage P3 vereist een imposant vakwerk, de High Bay oftewel een vol geautomatiseerde pallet opslag. Die met zijn hoogte van 35 meter boven de bouw uitsteekt. De pallet opslag biedt een capaciteit voor 30.000 pallets.

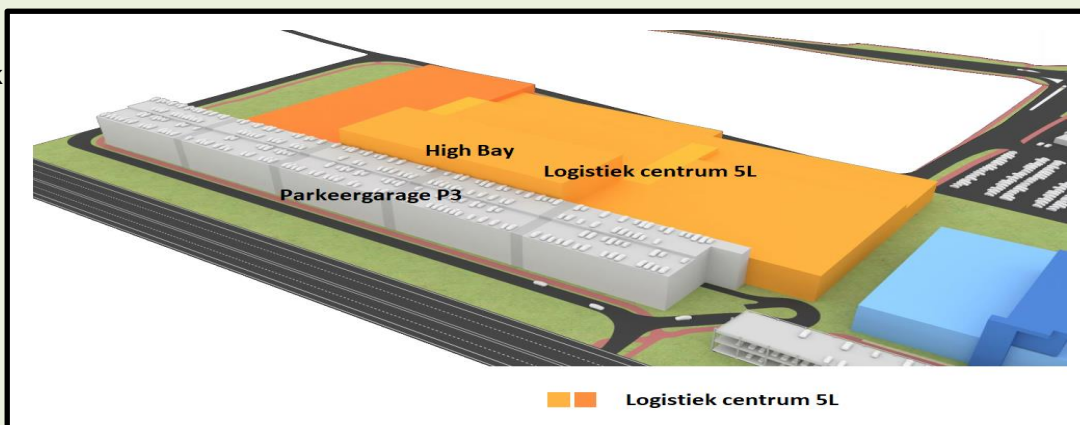

November 2019

November 2019



Gebied C1, C2 wordt tussen de gigantische betonnen kolommen, die de grote overspanningen moeten dragen het staalwerk gemonteerd. Op het dakniveau van 5L worden de stalen comflor elementen aangebracht, waarna ze voorzien worden van wapening en een betonnen druklaag. Voor de veiligheid zijn de netten aangebracht onder de staalconstructies. Verder zijn de gasbeton binnenwanden buitengevel voor een gedeelte aangebracht.

Melding

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven en graag de digitale nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar r.martens@bmv.nl of via de BMV projecten in uitvoering de projectsite 5L downloaden. U kunt op deze projectside ook de laatste foto's van de huidige voortgang van het project 5L bekijken.

Project informatie nieuwbouw ASML logistiek centrum 5L en nieuwbouw kantoren 6KLM.
Download QR code scanner.



bmv



ROLLEAF



bmv
